



**Projektbezeichnung** Neubau Löwen-Grundschule Brunsbachtal  
**Projektverantwortlicher** Rainer Frauendorf (Regionales Gebäudemanagement)  
 Tel.: 02192/ 88 - 610, E-Mail: rainer.frauendorf@hueckeswagen.de

**Projektphase** Leistungsphase 8  
 (Objektüberwachung)

**Sachstand**

- Projekt befindet sich in der Umsetzung
- Rohbau vor Fertigstellung, Fenstereinbau, Dachabdichtung in Ausführung
- Aussenanlagen Erdarbeiten der Schulhofflächen weitgehend abgeschlossen
- Vorbereitungen für den Innenausbau

**Herausforderung**

- Schließen der Gebäudehülle vor Wintereinbruch
- Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Materialien

**Finanzen (Brutto)**

Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung
14.900.000,- €	16.978.000,- €	17.390.000,- €
Haushaltsplan 2019	Büro Assmann - Mai 2019	Büro Assmann - Okt. 2019
Kostenanschlag	Kosten aktuell	Förderung
20.079.000,- €	20.078.726,56 €	ja - 1.509.000,- €
Büro Assmann - Okt. 2020	Stand 04.10. 2021	Haushalt - Investitionszuwendungen

**Erläuterung/ Entwicklung Kosten**

Nach der Generalunternehmer - Vergabe ist keine Kostensteigerung zu erwarten. Ein Kosten-Controlling findet statt.



Löwen-Grundschule Brunsbachtal

Nov 21


**Laufzeit**

Projektstart  
April 2018

Projektabschluss  
August 2022

**Zeitschiene**

Stand November 2021

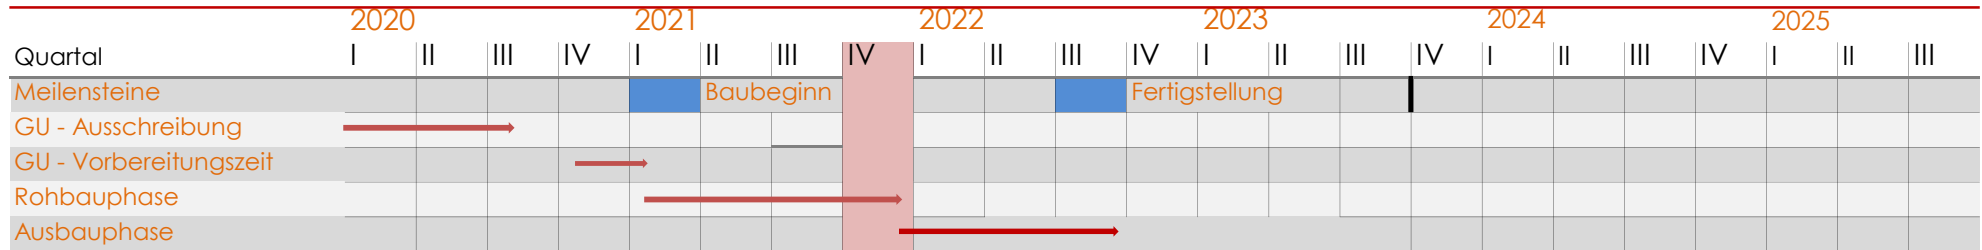

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene

- trotz fehlender Vorbereitungszeit (fehlerhafte Statik) des GU befindet sich das Projekt im angestrebten Terminplan
