



Projektbezeichnung Neubau Löwen-Grundschule Brunsbachtal
Projektverantwortlicher Rainer Frauendorf (Gebäudemanagement)
 Tel.: 02192/ 88 - 610, E-Mail: rainer.frauendorf@hueckeswagen.de

Projektphase Leistungsphase 8
 (Objektüberwachung)

Sachstand

- Projekt befindet sich in der Umsetzung
- Rohbau fertig gestellt, Fenster eingebaut, Fassade incl. Außenanstrich weitgehend fertig gestellt
- Aussenanlagen: Geländeflächen angelegt, Rohbau der Außenanlagen fertig, Bepflanzung weitgehend erfolgt, Pflasterung der Flächen anstehend
- Technische Gewerke in Ausführung, Trockenbau, Estrich, Putz ausgeführt, Bodenbeläge und Anstrich in Umsetzung

Herausforderung

- Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Materialien immer noch möglich

Finanzen (Brutto)	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung
	14.900.000,- € Haushaltsplan 2019	16.978.000,- € Büro Assmann - Mai 2019	17.390.000,- € Büro Assmann - Okt. 2019
	Kostenanschlag	Kosten aktuell	Förderung
	20.079.000,- € Büro Assmann - Okt. 2020	20.078.726,56 € Stand 25.02. 2022	ja - 1.509.000,- € Haushalt - Investitionszuwendungen

Erläuterung/ Entwicklung Kosten

Nach der Generalunternehmer - Vergabe ist keine Kostensteigerung zu erwarten. Ein Kosten-Controlling findet statt.
 Keine Veränderung der aktuellen Kosten.



Löwen-Grundschule Brunsbachtal

Mrz 22


Laufzeit

Projektstart
April 2018

Projektabschluss
August 2022

Zeitschiene

Stand März 2022

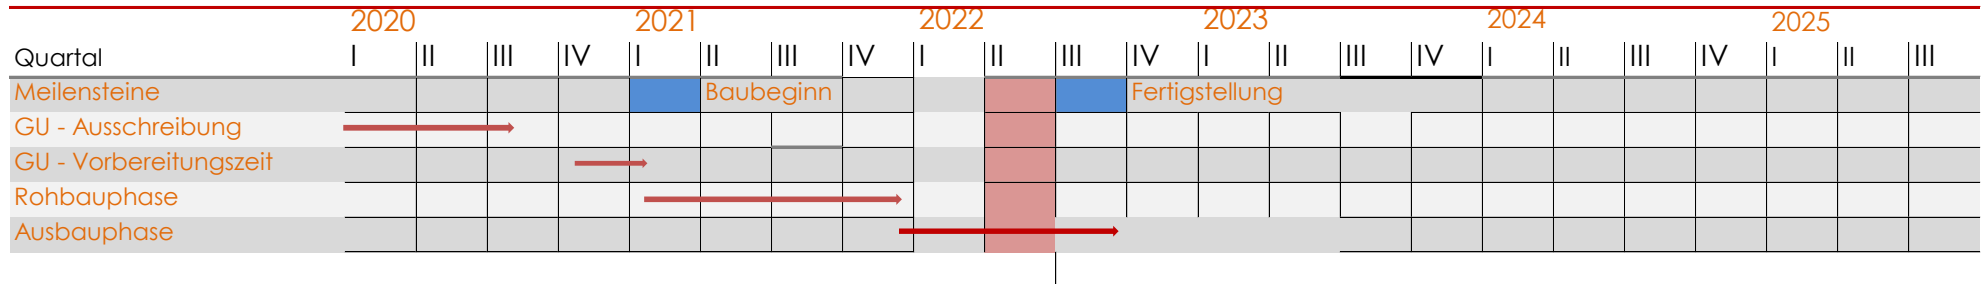

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene

- trotz schwieriger Materialbeschaffung
des GU befindet sich das Projekt im angestrebten Terminplan
